

Proyecto Terronera en fase final de conclusión: Galería de fotos



Puntos destacados hasta el cuarto trimestre de 2024

El proyecto está completado en un 89%; los gastos de capital actuales ascienden aproximadamente a \$302 millones al 31 de diciembre de 2024. La administración estima un gasto total para el proyecto de \$332 millones.

El programa y procedimientos de Salud y Seguridad han quedado concluidos y están listos para pasar de la fase de construcción y puesta en marcha a la de operaciones.

Se desarrollaron 1,694 metros de mina subterránea en el cuarto trimestre, sumando un total de 7,239 metros en el proyecto; se aprobó el permiso para el almacenamiento subterráneo de explosivos, mejorando la eficiencia del desarrollo.

Plataforma superior – Gran parte de la construcción está completada con los últimos ajustes siendo abordados y diversas áreas siendo entregadas al equipo de puesta en marcha y operaciones.

Plataforma inferior – El área de la plataforma inferior está completada en un 42% con el terraplén principal alcanzando una elevación de 1,185 metros; los tanques de almacenamiento se ensamblaron con pruebas hidrostáticas y anclaje por completarse en el primer trimestre de 2025.

Revestimiento del estanque de contingencias – Instalado con el revestimiento de los canales de alimentación y desbordamiento por completarse en el primer trimestre de 2025 (conclusión en enero).

Edificaciones auxiliares – La construcción del edificio del laboratorio quedó concluida; el edificio de mantenimiento de la planta alcanzó un 80% de avance y se tiene programada la finalización para mediados del primer trimestre de 2025.

Seguimos enfocándonos en programas comunitarios; apoyando una serie de iniciativas e inversiones locales.

Reforzamiento de la seguridad todos los días



Se adopta la cultura de seguridad “Te Cuido”

La salud, seguridad y bienestar de nuestros empleados y contratistas son una de las máximas prioridades de Endeavour Silver. Ponemos un fuerte énfasis en la capacitación en seguridad y la concientización de riesgos, reconociendo su papel crucial en la promoción de un ambiente de trabajo seguro.

Además de estas prioridades, estamos comprometidos con la evolución continua y la mejora de todas nuestras prácticas e iniciativas. Esta dedicación garantiza que nos mantenemos a la vanguardia de los riesgos potenciales y mantenemos los más altos estándares de seguridad para todos los involucrados.



El programa y procedimientos de Salud y Seguridad están listos para pasar de la fase de construcción y puesta en marcha a la de operaciones.



Desarrollo minero

Los equipos mineros siguieron trabajando en las rampas de los portales 1, 2 y 4.

Desarrollo subterráneo



Desarrollo en el área de la rampa 2/4.



Acopio de mineral triturado.



Acceso en el portal 4



Plataforma superior

Enfocados en finalizar para entregar al equipo de puesta en marcha y operaciones.

Área de trituration primaria y molienda




Plataforma superior



Se han triturado 6,000 toneladas de mineral.



Acopio de mineral triturado.

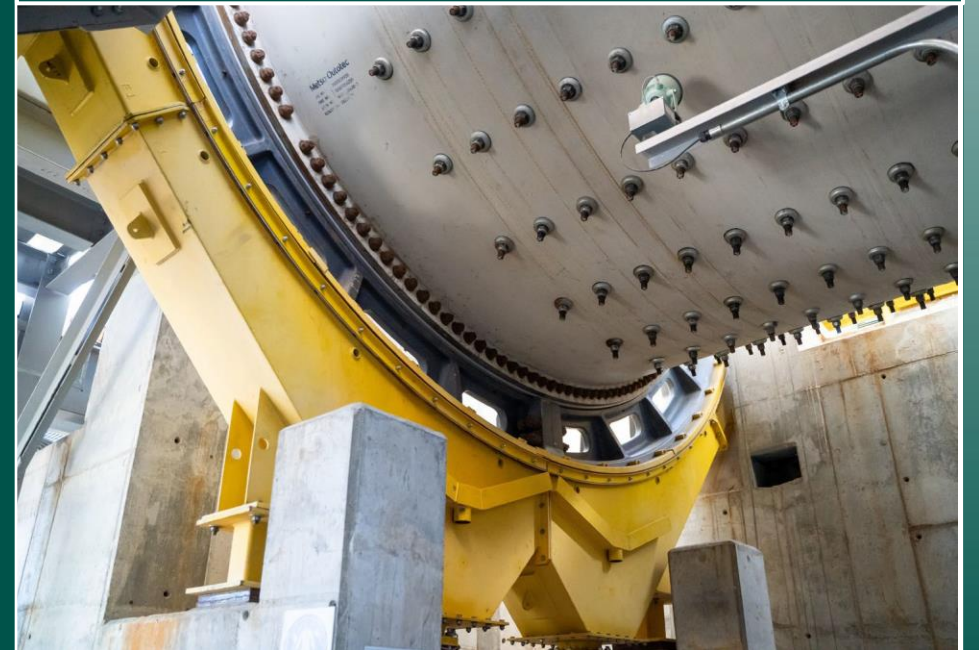

Molino SAG.



Área de flotación

Instalaciones del área de flotación.

Área de flotación



Ciclones de remolienda.



Celdas de flotación primarias



Ciclones primarios



Líneas de distribución de reactivos



Plataforma inferior y área de instalaciones de almacenamiento de jales (TSF)

El terraplén principal alcanzó la elevación de 1,185 metros, mientras que la plataforma inferior quedó completada en un 42%; asimismo, se instaló el revestimiento del estanque de contingencias.

Plataforma inferior y TSF



Instalación de revestimiento del estanque de contingencias.



Plataforma inferior



Plataforma inferior



Canal de desvío



Edificios auxiliares

La construcción del edificio del laboratorio quedó concluida y se entregó a operaciones, mientras que el edificio de mantenimiento de la planta alcanzó un 80% de avance y se completará a mediados del primer trimestre de 2025.

Edificio de laboratorio y mantenimiento de la planta



Hornos de secado



Preparación de muestras.



Estación de computadoras del laboratorio de análisis



Estación de inicio/paro de equipos

Plan de preparación operativa



Al final del cuarto trimestre de 2024, la fuerza laboral de Terronera incluía a 297 empleados de Endeavour Silver y 821 trabajadores temporales.



Siguientes pasos

Los esfuerzos en la plataforma superior se centrarán en la instalación de los elementos restantes, la finalización de la lista de pendientes y la puesta en marcha.

Se espera que el terraplén principal de la TSF alcance la elevación final de 1,198 metros.

Se instalarán los filtros de relaves y concentrados, junto con la tubería final, trabajos eléctricos e instrumentación.

Los elementos críticos restantes son las prensas de filtro de relaves, que se espera queden concluidas a principios del segundo trimestre de 2025.

Calendario hacia la producción



1. Estos plazos no tienen en cuenta interrupciones en el mercado laboral ni restricciones en las cadenas de suministro globales.

Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros

Esta presentación contiene "declaraciones sobre hechos futuros" ("forward-looking statements"), dentro del significado que la Ley Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) de los Estados Unidos atribuye a este término, así como "información sobre hechos futuros" ("forward-looking information"), conforme a la legislación bursátil canadiense. Tales declaraciones e información sobre hechos futuros contenidas en el presente documento incluyen, entre otras, declaraciones sobre el desarrollo y el financiamiento del Proyecto Terronera, lo que abarca: estimaciones de costos de capital; los tiempos que se prevén para la construcción y puesta en marcha del proyecto; las operaciones, costos y gastos proyectados de Terronera; y el calendario y los resultados de diversas actividades relacionadas. La Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar las declaraciones e información sobre hechos futuros, salvo por lo que exija la legislación aplicable.

Las declaraciones o información sobre hechos futuros implican riesgos –conocidos y desconocidos–, incertidumbres y otros factores que podrían ocasionar que los resultados reales de Endeavour, el nivel de actividad, los niveles de producción, el rendimiento o los logros de la Compañía y de sus operaciones sean considerablemente diferentes de lo que se expresa o da a entender en tales declaraciones. Estos factores incluyen, entre otros, cambios en los pronósticos de producción y costos; los persistentes efectos de la inflación y problemas en las cadenas de suministro sobre el rendimiento económico de la mina; cambios en los gobiernos nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos políticos y económicos en Canadá, Chile, los Estados Unidos y México; riesgos financieros producto de los precios de los metales; dificultades operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los riesgos y peligros de la exploración, desarrollo y extracción de minerales; la naturaleza especulativa de la exploración y desarrollo de minerales; riesgos en la obtención de las licencias y permisos necesarios; la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones al amparo de la línea de crédito para el proyecto; los persistentes efectos de la inflación y problemas en las cadenas de suministro sobre el rendimiento económico del Proyecto Terronera; fluctuaciones en los precios del oro y la plata, así como en los mercados cambiarios (en específico el peso mexicano, el peso chileno, el dólar canadiense y el dólar estadounidense); objeciones a los títulos de propiedad de la Compañía; y los factores descritos en la sección "factores de riesgo", contenidos en el Formulario de Información Anual 40/F más reciente que la Compañía ha presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores de Canadá.

Las declaraciones sobre hechos futuros se basan en supuestos que la administración considera razonables, incluyendo, entre otros: el funcionamiento continuo de las operaciones mineras de la Compañía, la inexistencia de cambios adversos importantes en el precio de mercado de los productos genéricos, el rendimiento económico que se prevé para la mina Terronera para 2024, que las minas operen y los productos mineros sean terminados de conformidad con las expectativas de la administración y se logren los resultados de producción declarados, así como los demás supuestos y factores expuestos en este documento. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales difieran en forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o información sobre hechos futuros, otros factores podrían provocar que los resultados varíen en forma importante de aquellos previstos, descritos, estimados, evaluados o pretendidos. No se puede garantizar que las declaraciones o información sobre hechos futuros resulten precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir considerablemente de los que se anticipan en dichas declaraciones o información. En ese sentido, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o información sobre hechos futuros.

Galería de fotos

Esta presentación se debe consultar junto con el comunicado de prensa adjunto, de fecha 7 de febrero de 2025.

